УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
города Мурманска
_____ Левченко Л. М.
«25» сентября 2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *здание гимназии*
1.2. Адрес объекта: *183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 5841,6кв.м.
1.4. *Год постройки здания – 1980* г. последнего капитального ремонта: - .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2014г.-2016г., капитального-2014-2016г..
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения): *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска Гимназия № 6 (МБОУ г.Мурманска Гимназия № 6)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):*183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18*
1.8. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*
1.9. Форма собственности*государственная*
1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальная*
1.11. Вышестоящая организация:*Комитет по образованию администрации города Мурманска*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.51, телефон: (815-2) 45-00-46, e-mail: obrazovanie@citymurmansk.ru*

2. Характеристика деятельности организации на объекте*(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: *образование.*
2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация образовательных программ основного общего начального образования, основного общего образования, основного среднего образования и обеспечение воспитания детей.*
2.3 Форма оказания услуг: *на объекте.*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети школьного возраста.*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалидыс костно-мышечной патологией, инвалиды по заболеванию.*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:710 *воспитанников.*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да, 5 человек.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусом №№ 10;5;27;106;110: до остановки Беринга.
Троллейбусом № 4;6;10 до остановки Беринга.
Автобусом № 29 до остановки пр. Ледокольный.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта*Беринга* 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10-12 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*
3.2.5 Перекрестки: *регулируемые, по улицеБеринга*
3.2.6 Информация на пути следования к объекту:*нет*
3.2.7 Перепады высоты на пути: *есть, подъем/спуск в гору.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.2.4 расстояние до объекта от остановки транспорта *Беринга* 500 м.
3.2.5 Перекрестки: *регулируемые, по улицеБеринга и пр.Кольский; не регулируемый по улице Беринга и пр. Ледокольный.*
3.2.6 Информация на пути следования к объекту:*нет.*
3.2.7 Перепады высоты на пути: *есть, подъем/спуск в гору.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10-12 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*
3.2.4 Перекрестки:регулируемые, по улице Беринга и пр. Кольский; не регулируемый по улице Беринга и пр. Ледокольный.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:*нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, спуск/ подъем в гору.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категорииинвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (Г,У)**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (Г,У)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ВНД**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДЧ-И (Г,У)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-И (Г,У)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ВНД**

** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД**–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Разработка и реализация проекта реконструкции территории и элементов здания (входная группа, пути следования внутри здания, зоны обслуживания, места общего пользования) в соответствии с положениями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 605) не возможна из-за габаритных размеров лестничных маршей, местоположения здания гимназии

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт с реконструкцией
8	**Все зоны и участки**	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ: 2015-*2016г.*
в рамках исполнения: *программа «Доступная среда».*
4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И(Г, У).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-И(Г, У).
4.4. Для принятия решения требуется:
4.4.1. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
4.4.2.разработка проектно-сметной документации.
4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности**дата** _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «25» сентября 2014 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «25» сентября 2014 г.

3. Решения Рабочей группы утвердить от «25» сентября 2014 г.

Приложение №1

Территория прилегающая МБОУ Гимназии №6. Вход в гимназию.

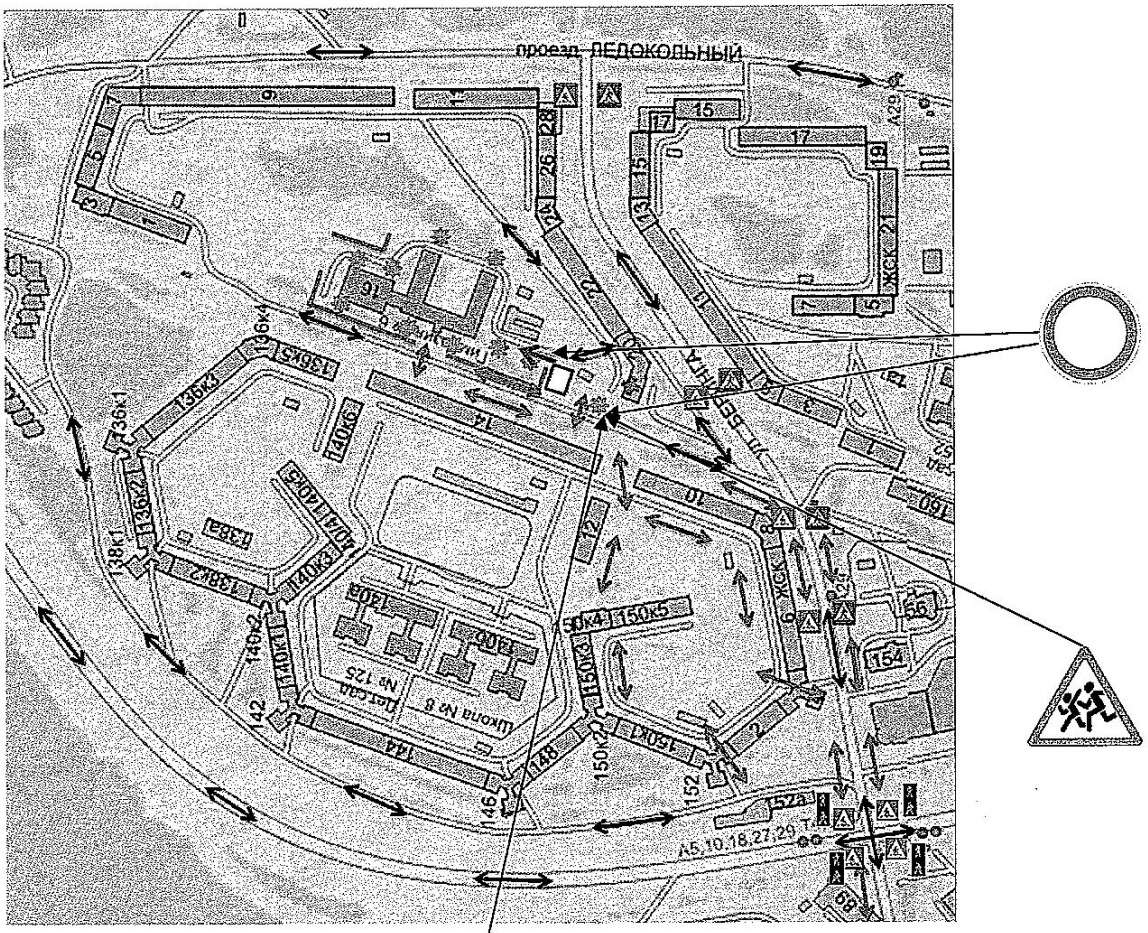

Приложение N 2

План первого этажа МБОУ Гимназии №
(санитарно-гигиенические помещения, пути движения)

Приложение № 3

План первого этажа МБОУ Гимназии №6
(пути движения в здании, зоны целевого назначения)

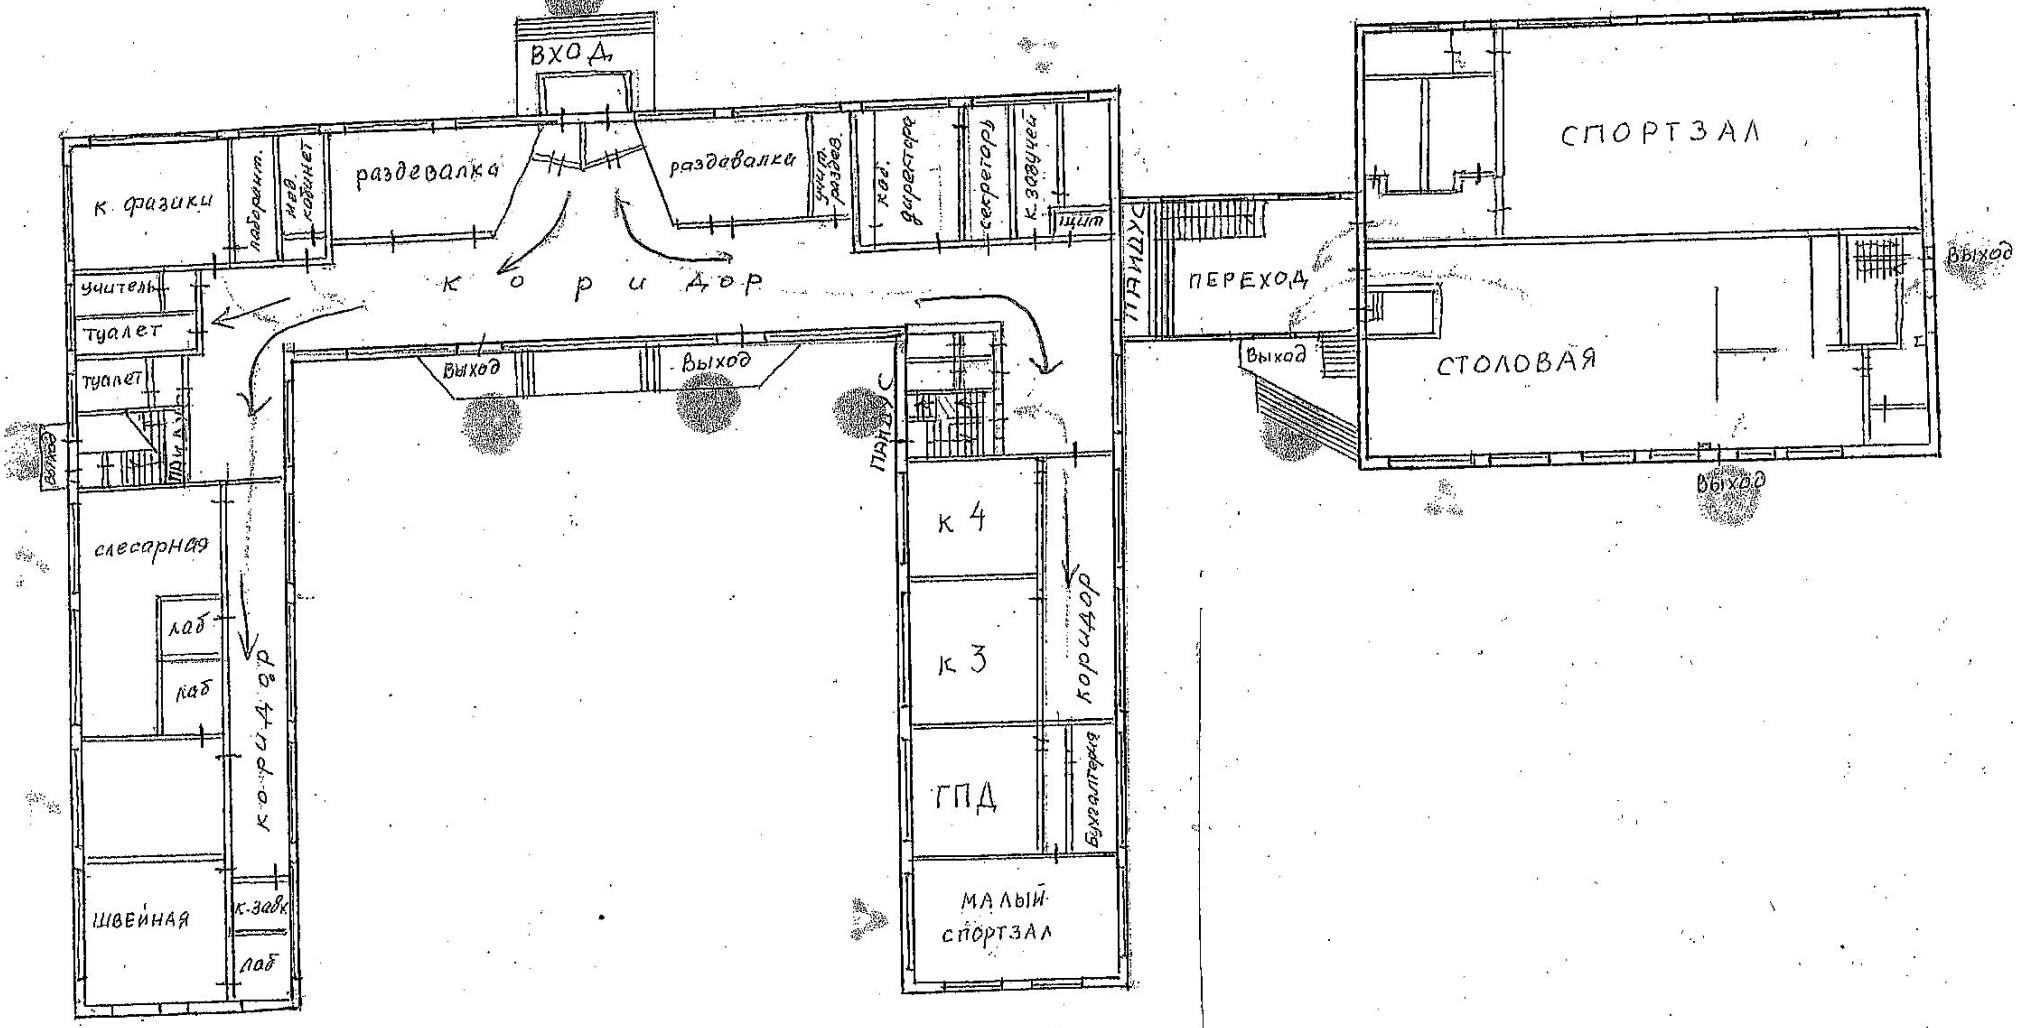

Приложение №4

План второго этажа МБОУ Гимназии №6
(зоны целевого назначения)

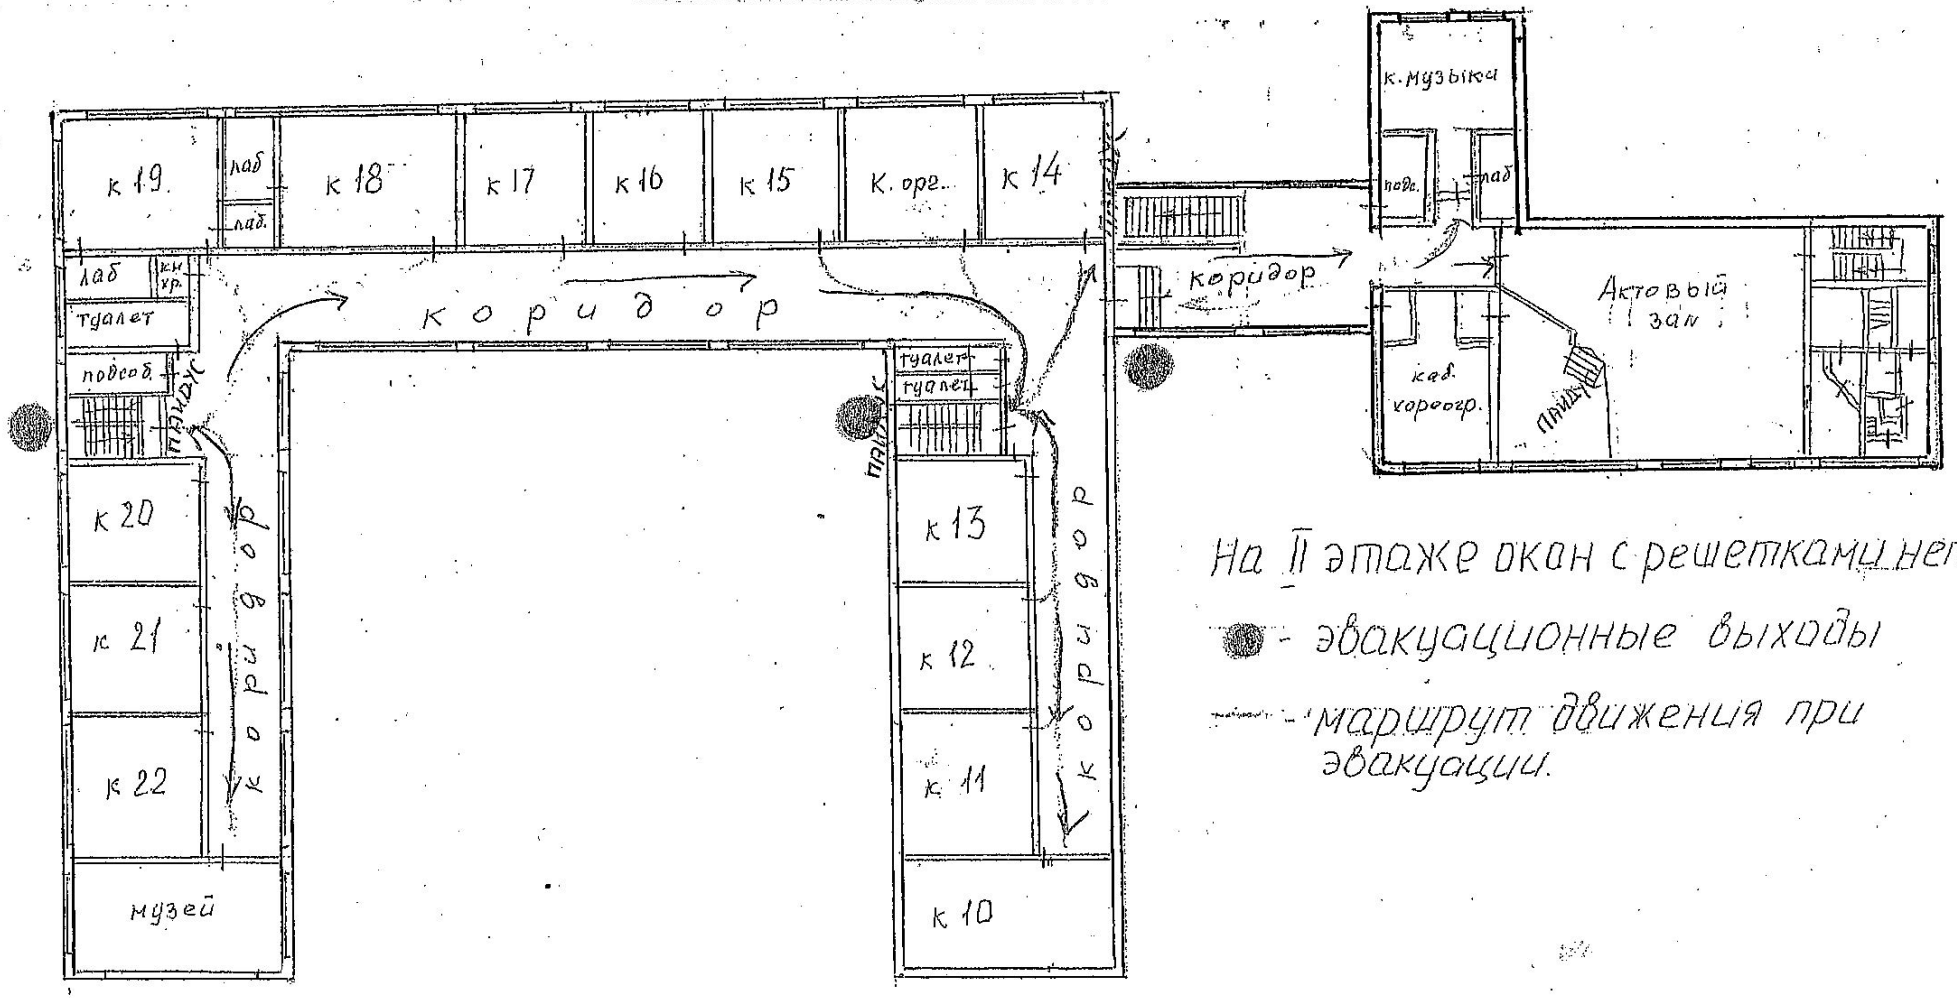

На II этаже окон с решеткамиНет

- эвакуационные выходы

- маршрут движения при эвакуации.

12

Приложение №5

План третьего этажа МБОУ Гимназий
(зоны целевого назначения)

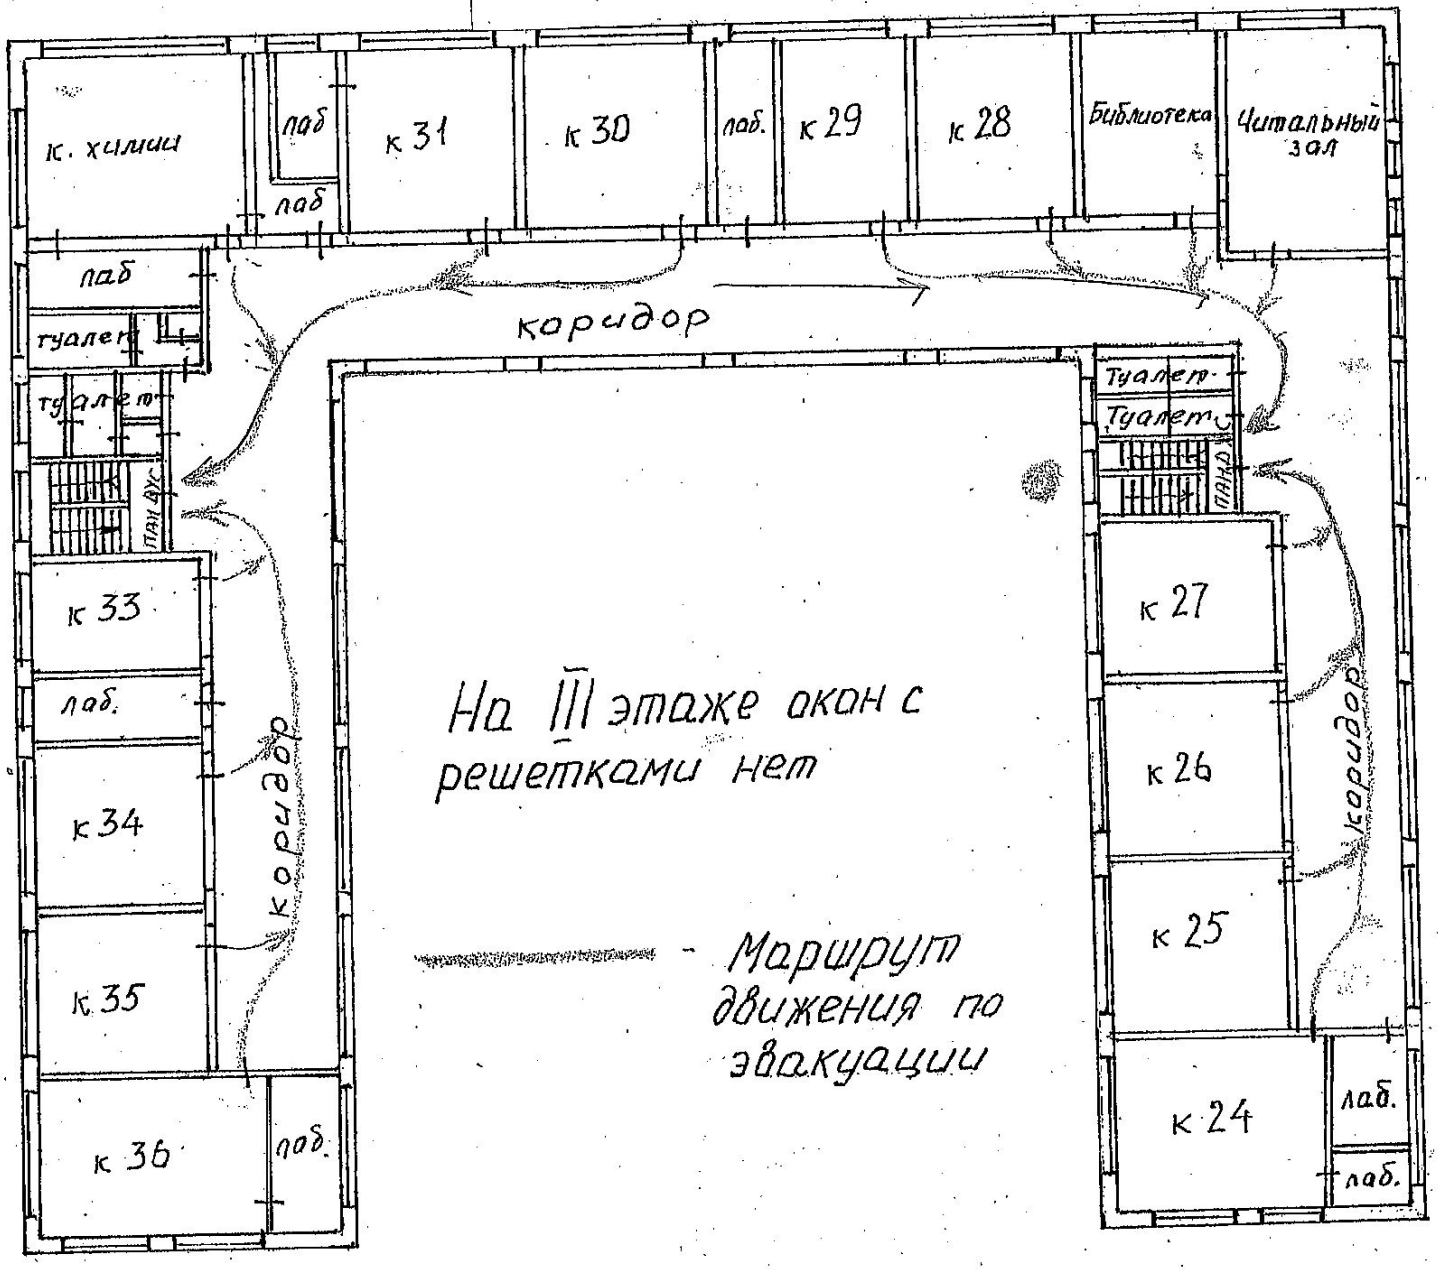

Приложение №6

Пути движения транспортных средств и обучающихся к объекту

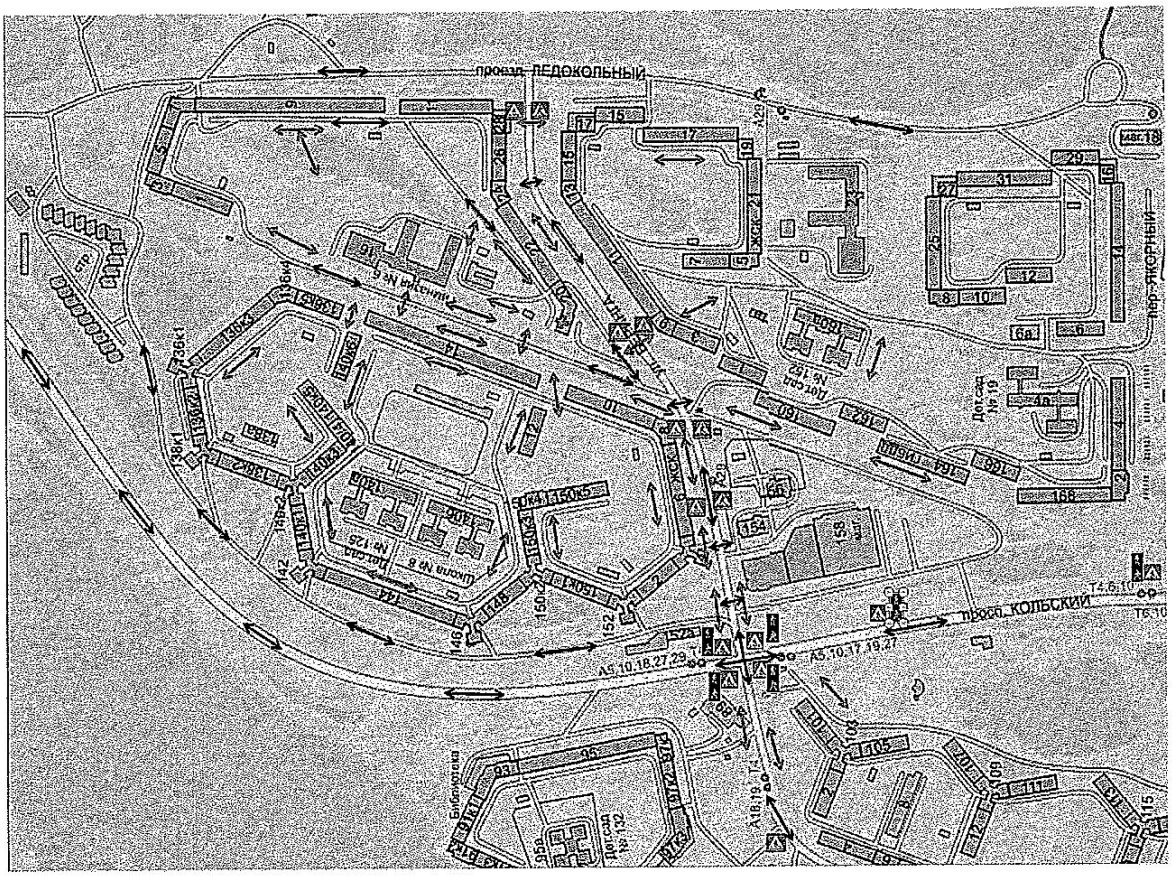

	жилая застройка		*движение транспортных средств*
	проезжая часть		*движение обучающихся в (из) гимназию*
	регулируемый пешеходный переход		*остановки общественного транспорта*
	нерегулируемый пешеходный переход		*опасные зоны пересечения транспортных путей вне пешеходных переходов*
	светофорные объекты		

Приложение №6/1

Пути движения транспортных средств и обучающихся к объекту

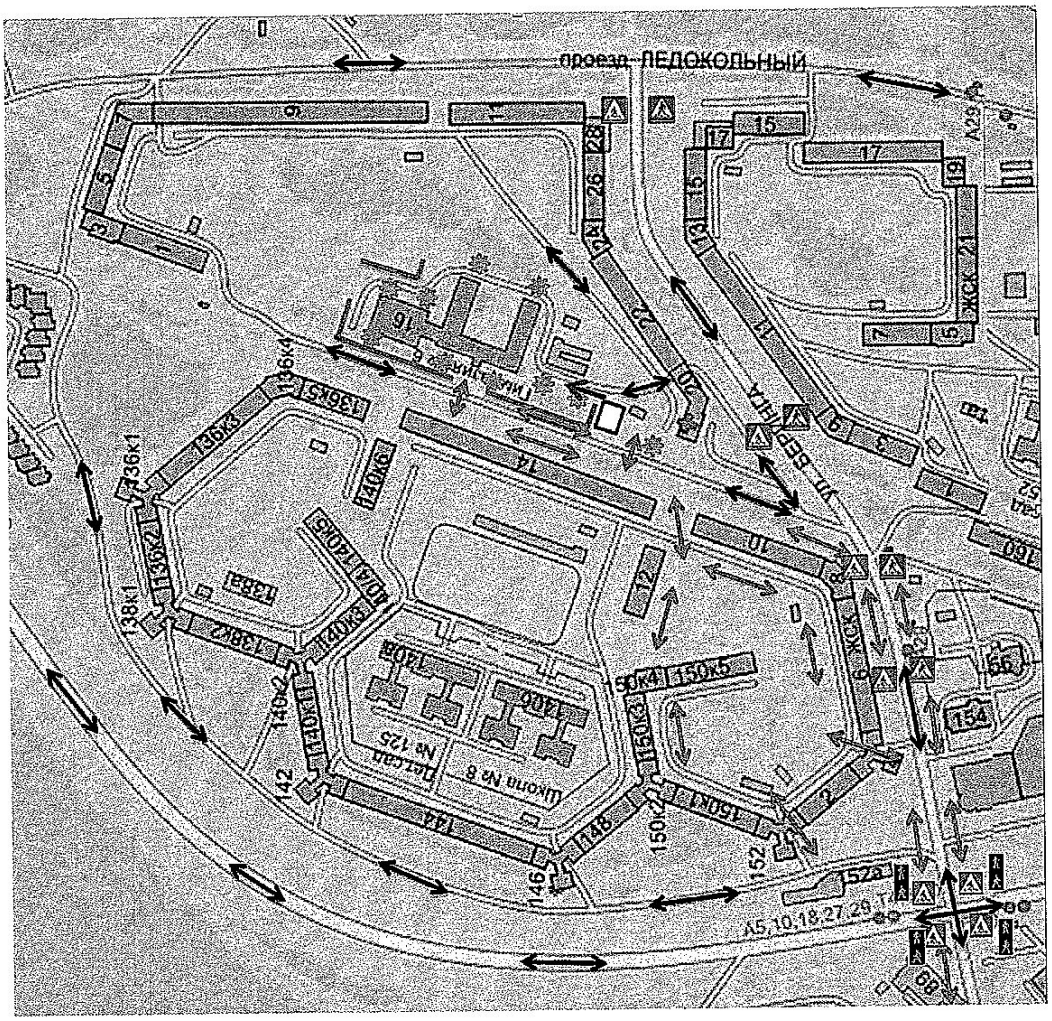

—	*ограждение Гимназии*	⟷	*направление движения транспортного потока*
✳	*искусственное освещение*	⟷	*направление движения обучающихся от остановок маршрутных транспортных средств*
▯	*парковочное место*	⟵	*направление движения обучающихся от остановок частных транспортных средств*

Здание гимназии расположено на ул. Беринга параллельно пр. Кольскому. Территория, прилегающая к гимназии, имеет достаточно ровный рельеф и поэтому плотно застроена жилыми домами. Непосредственное и ближайшее окружение жилые дома №№ – 10,14,20,22,24,26 по ул. Беринга; 136/5, 136/3 по пр. Кольскому; 1,3,5,7,9 по пр. Ледокольному.

В шаговой доступности находится подстанция медицинской скорой помощи.

Приложение № 9

4. Рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения

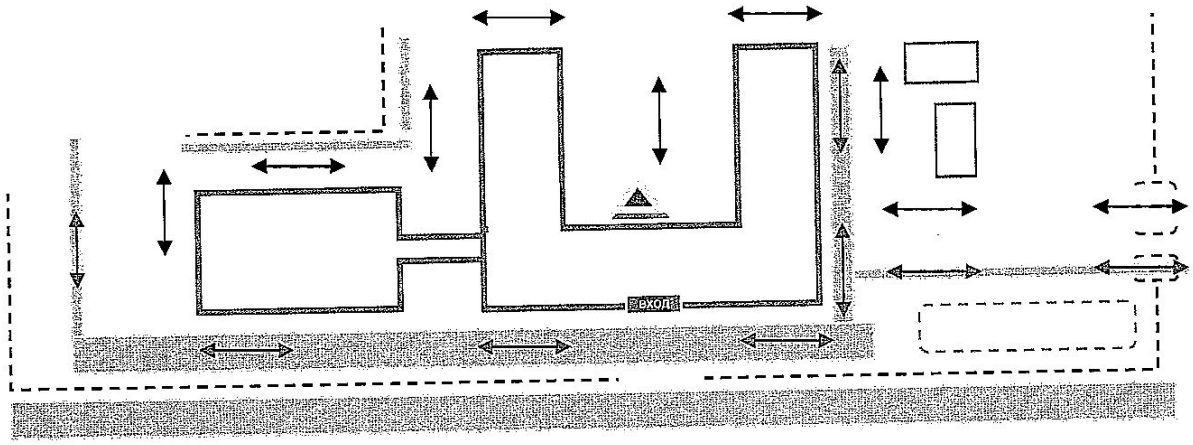

	въезд/выезд грузовых транспортных средств (ворота)		*калитка для пешеходов*
	движение грузовых транспортных средств по территории Гимназии		*движение обучающихся на территории МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6»*
	тротуарные дорожки	**ВХОД**	*Вход в здание*

Участок МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6» имеет два заезда со стороны ул. Беринга (один - непосредственно на территорию гимназии, второй – напротив здания со стороны центрального входа), для сквозного проезда транспорта (пожарный выезд) необходима отсыпка дороги.

Территория Гимназии ограничена забором по периметру здания (высотой 1,8м, длиной 400 м.).

Въезд на территорию ограничен металлическими воротами (высота - 1,8м, ширина – 5м). Ворота открываются вручную.

Приложение № 7

Программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории г. Мурманска на 2015-2016год

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***МБОУ г.Мурманска Гимназия № 6***	***183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18***		Восстановление асфальтового покрытия (частично)	КР	ДПВ	500,000	Федеральное Региональное Муниципальное	Комитет по образованию администрации города Мурманска	2016 декабрь
				Капитальный ремонт кровли	КР,Рек	ДПВ	10000,00			2015 декабрь
				Ремонт входной группы (запасные выходы)			1 200,00			2016 декабрь
				Ремонт ж/бетонного пола вестибюля, ступеней и маршей л/клеток, замена линолеума	КР,Рек	ДПВ	1050,00			2016 декабрь
				Реконструкция санузлов	КР	ДЧ-И (Г,У)	1150,00			2016 декабрь
				Установка	ПСД;	ДЧ-И (Г,У)	100,000			

				зуальных устройств. Установка акустических устройств. Установка тактильныхсредст в информации	КР,Рек					2016 декабрь
				Реконструкция пандуса	КП	ДЧ-И (Г,У)	100,00			2016 декабрь
				Установка ограждения	КП	ДП-В	250000,00			2016 декабрь

Примечание:*структура (разделы) программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт
ПСД – подготовка проектно-сметной документации
Стр - строительство
КР – капитальный ремонт
Рек – реконструкция
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение № 8

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории г. Мурманска за год

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***МБОУ г.Мурманска гимназия № 5***	***183050, г.Мурманск, ул.Беринга, д.18***	**2**						Отсутствие финансирования	

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Приложение №9

Пути передвижения детей по территории

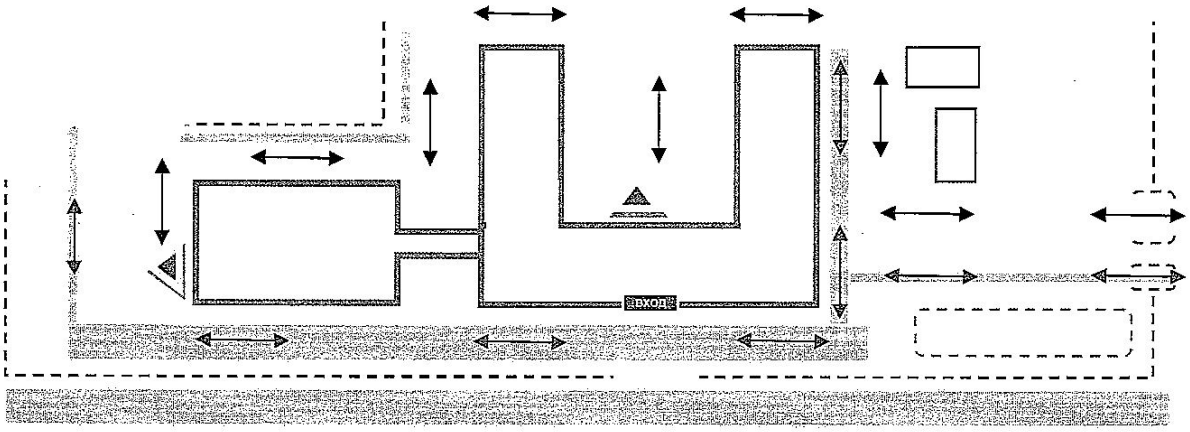

⟷	*движение грузовых транспортных средств по территории Гимназии*	⟷	*движение обучающихся на территории Гимназии*
	тротуарные дорожки	**Вход**	*Вход в здание*

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от «25» сентября 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска Гимназия № 6 (МБОУ г. Мурманска Гимназия № 6).

Адрес объекта: ***183050, г.Мурманск, ул. Беринга.д.18.***

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№2	№3	Соответствует нормам	всем	Соответствует нормам	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№2	№1	Деформация, провалы, просадка грунта ,трещины асфальтового покрытия	К, О, С	Восстановление асфальтового покрытия	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	№ 2, 7	№ 3, 19	Деревянные элементы лестницы подвержены гниению. Просадка и зыбкость ступеней	К, О, С, Г, У	Замена деревянной лестницы с устройством поручней	Капитальный ремонт с реконструкцией
1.4	Пандус (наружный)	нет	№ 7	№ 20	Отсутствует пандус	К, О		Устройство пандусов
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет		нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

ПЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г,У)	№ 2	№1	Капитальный ремонт с реконструкцией лестниц (наружных)

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Асфальтовое покрытие территории имеет трещины, деформацию, провалы и просадку грунта.

- требуется выборочный ремонт отдельных участков, замена асфальтового покрытия нижней дороги.

Территория, прилегающая к зданию имеет 3 лестницы (наружные).

Центральнаядеревянная лестница:

- капитальный ремонт с реконструкцией, с заменой деревянного основания на железобетонное, с установкой пандуса и поручней.

Лестница аварийного выхода № 3:

- капитальный ремонт с заменой ступеней на косоурахс установкой поручней

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25» сентября 2014 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска Гимназия № 6
Адрес объекта: ***183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18***

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№ 7	№ 19	Не соответствует нормам	всем	Капитальный ремонт с реконструкцией лестниц	Капитальный ремонт с реконструкцией лестниц
2.2	Пандус (наружный)	нет	№ 7	№ 20	отсутствует	всем		Устройство пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 2	№ 4	Не соответствует нормам	всем	Выбоины и сколы поверхности ж/б плиты и ступеней, отслоение штукатурного слоя косоуров	Капитальный ремонт с устройством пандуса.
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 2	№ 5	Не соответствует нормам	всем	Неплотное примыкание и перекос дверных полотен, расслоение декоративной отделки	Замена дверного блока
2.5	Тамбур	есть	№ 6	№ 6	Не соответствует нормам	всем	Выбоины и сколы ж/бетонной поверхности,	Выравнивание ж/бетонной поверхности
	ОБЩИЕ требования к зоне							

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	**ДЧ-И (Г, У)**	№1	№1,2,3	Капитальный ремонт с реконструкцией

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Центральный вход в здание оборудован лестницей, которая имеет выбоины и сколы поверхности ж/б плиты и ступеней, отслоение штукатурного слоя косоуров, отсутствует пандус.

Козырек центрального входы имеет трещины, при дождях и таянии снега происходит залитие.

Установить частично дверной металлический блок центрального входа (тамбур), имеет высокую степень износа, перекосы дверных полотен из-за деформации дверных петель, неплотное примыкание, отсутствует теплоизоляция.

В тамбуре выбоины и сколы ж/бетонной поверхности пола.

Требуется капитальный ремонт с реконструкцией входной группы.

Приложение № 7

Программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории г. Мурманска на 2014-2016год

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***МБОУ г.Мурманска Гимназия № 6***	***183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18***		Восстановление асфальтового покрытия (частично)	КР	ДПВ	500,000	Федеральное Региональное Муниципальное	Комитет по образованию администрации города Мурманска	2016 декабрь
				Капитальный ремонт кровли	КР,Рек	ДПВ	10000,00			2015 декабрь
				Ремонт входной группы (запасные выходы)			1 200,00			2016 декабрь
				Ремонт ж/бетонного пола вестибюля, ступеней и маршей л/клеток, замена линолеума	КР,Рек	ДПВ	1050,00			2016 декабрь
				Реконструкция санузлов	КР	ДЧ-И (Г,У)	1150,00			2016 декабрь
				Установка	ПСД;	ДЧ-И (Г,У)	100,000			

				изуальных устройств. Установка акустических устройств. Установка тактильныхсредст в информации	КР,Рек					2016 декабрь
				Реконструкция пандуса	КП	ДЧ-И (Г,У)	100,00			2016 декабрь
				Установка ограждения	КП	ДП-В	250000,00			2016 декабрь

Примечание:*структура (разделы) программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт
ПСД – подготовка проектно-сметной документации
Стр - строительство
КР – капитальный ремонт
Рек – реконструкция
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25 » сентября 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.МурманскаГимназия № 6

Адрес объекта: ***183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18***

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№3	№4, 5,6,7	Выбоины и сколы ж/бетонной поверхности пола, истирание и разрывы линолеумного покрытия	К,О, С		Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№2,3 4,5,	№4, 5,7	Выбоины и сколы ж/бетонной поверхности ступеней	всем	Ремонт с заменой отдельных ступеней	Капиталь ный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	№2,3 4,5	№ 4, 5,7	Здание 1980 г. постройки. Капитальный ремонт с реконструкцией.	К, О	ремонт (текущий, капиталь-ный);.	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Здание 1980г.постройки. Капитальный ремонт с реконструкцией.	К.О.	ремонт (текущий, капиталь-ный);	-
3.5	Дверь	есть	№ 3,4,5	№ 4,5,6	Соответствует нормам.	всем	Открытие не по направлению движения	индивиду альное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№1, 3,4, 5-7	№ 1-7, 9-13	Соответствует нормам.	всем	Текущий ремонт	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	**ДЧ-И (Г,У)**	№3	№ 7-13, 25, 26	Технические решения невозможны

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пути движения внутри здания по коридорам имеют полы с линолеумным покрытием. При длительной эксплуатации поверхность имеет множественные прорывы и потертости.

Ж/бетонные полы вестибюля при длительной эксплуатации имеют множественные сколы и выбоины.

Лестница (внутри здания) имеют выбоины и сколы ж/бетонной поверхности ступеней

Приложение № 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25 » сентября 2014 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.МурманскаГимназия №6

Адрес объекта: ***183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18***

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			нет		нет	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			нет		нет	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	нет	-	нет	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	нет	-	нет	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	нет	-	нет	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

ПЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зоны целевого назначения здания(зона обслуживания инвалидов) **нет.**Требуется индивидуальное решение с ТСР.

Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25 » сентября 2014 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.МурманскаГимназия № 6

Адрес объекта: ***183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18***

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 2	8		К, О, С, Г, У	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть					-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-И (Г,У)	№ 2	№ 8	индивидуальное решение с ТСР

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Требуется индивидуальное решение с ТСР

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «25» сентября 2014 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.МурманскаГимназия № 5

Адрес объекта: ***183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18***

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Визуальной информации нет	К,О,Г,У	Установить визуальную информацию	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Акустических средств нет	К,О,С	Установить акустические средства	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства	К.О,С,Г	Установить тактильные средства	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О, С,Г)	-	-	Текущий ремонт

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Системы информации на объекте**нет.**

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ г. Мурманска
Гимназия № 6
_____ Е.В.Воробьева
«26» сентября 2014г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***здание МБОУ г. Мурманска Гимназия № 6***
1.2. Адрес объекта: ***183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д. 18***
1.3. Сведения о размещении объекта:
- ***отдельно стоящее здание из 3 этажей, 5841,6кв.м.***
1.4. ***Год постройки здания – 1980*** г., последнего капитального ремонта: - .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2015г.-2016г., капитального - .
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения): ***Муниципальное общеобразовательное учреждение г.Мурманска Гимназия № 6 (МБОУ г.Мурманска Гимназия № 6)***
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):***183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18***
1.8. Основание для пользования объектом: ***оперативное управление***
1.9. Форма собственности***государственная***
1.10. Территориальная принадлежность: ***муниципальная***
1.11. Вышестоящая организация:***Комитет по образованию администрации города Мурманска***
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ***183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.51, телефон: (815-2) 45-00-46, e-mail: obrazovanie@citymurmansk.ru***

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: ***образование.***
2.2 Виды оказываемых услуг: ***реализация образовательных программ начального образования, основного общего образования, основного среднего образования и обеспечение воспитания детей.***
2.3 Форма оказания услуг: ***на объекте.***
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***дети школьного возраста.***
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***инвалиды с костно-мышечной патологией, инвалидность по заболеванию.***
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : **710** ***воспитанников.***
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): ***да, 5 человек.***

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусом №№ 10;5;27;106;110: до остановки Беринга.
Троллейбусом № 4;6;10 до остановки Беринга.
Автобусом № 29 до остановки Ледокольная.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта Беринга 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10-12 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.5 Перекрестки: регулируемые, по улице Беринга
3.2.6 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.7 Перепады высоты на пути: есть, подъем/спуск в гору.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.2.4 расстояние до объекта от остановки транспорта Беринга 500 м.
3.2.5 Перекрестки: регулируемые, по улице Беринга и пр. Кольский; не регулируемый по улице Беринга и пр. Ледокольный.
3.2.6 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.7 Перепады высоты на пути: есть, подъем/спуск в гору.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
Автобусом №№ 10;5;27;106;110: до остановки Беринга.
Троллейбусом № 4;6;10 до остановки Беринга.
Автобусом № 29 до остановки Ледокольная
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта Беринга 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10-12 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.5 Перекрестки: регулируемые, по улице Беринга
3.2.6 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.7 Перепады высоты на пути: есть, подъем/спуск в гору.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ
(формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	**Категорияинвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт с реконструкцией
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт с реконструкцией
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения	индивидуальное решение с ТСР

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт с реконструкцией
8.	**Все зоны и участки**	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано:
Зам. директора по АХР Горохова Т.В. 52-79-13; 8-921-159-64-91
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
города Мурманска
_____ Левченко Л. М.
«25 » сентябрь 2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИОСИ№ 1

«25» сентябрь 2014 г.

г. Мурманск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: *зданиегимназии*
1.2. Адрес объекта: ***183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18***
1.3. Сведения о размещении объекта:
- ***отдельно стоящее здание из 3 этажей, 5841,6 кв.м.***
- наличие прилегающего земельного участка (да,); ***20460кв.м.***
1.4. Год постройки здания ***1980г.,*** последнего капитального ремонта: **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2014г.-2016г., капитального -2015-2016г..*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска Гимназия № 6 (МБОУ г.Мурманска Гимназия № 6).***
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ***183050, г.Мурманск, ул. Беринга, д.18.***

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: ***реализация образовательных программ основного общего начального образования, основного общегообразования, основного среднего образованияи обеспечение воспитания детей.***

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусом №№ 10;5;27;106;110: до остановки Беринга.
Троллейбусом № 4;6;10 до остановки Беринга.
Автобусом № 29 до остановки Ледокольная.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта*аптека* 50 м./*магазин «Деликат»*150 м.
3.2.2 время движения (пешком) 4-7 мин./10-12 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*
3.2.4 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки Беринга до здания гимназия №6 -500 м.
3.2.5 Перекрестки: *регулируемые, по улицеБеринга и пр.Кольский*
3.2.6 Информация на пути следования к объекту:*в наличии(приложение № 6фото №1-3 9-13)*
3.2.7 Перепады высоты на пути: *есть, подъем/спуск в гору.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категорияинвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	**ДУ**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ВНД**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями умственного развития	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И(Г, У)**	№1	№1,2,3
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И(Г, У)**	№ 1,7	№1,2,3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ВНД**	№ 3-5	№4-7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДЧ-И(Г, У)**	№ 3-5	№ 2,3,4
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И(Г, У)**	№ 2	№8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД**	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ВНД**	№ 6-6/1	№ 1-3, 9-13

Указывается:ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично-условно. Необходима разработка и реализация проекта реконструкции территории и элементов здания (входная группа, пути следования внутри здания, зоны обслуживания, места общего пользования) в соответствии с положениями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 605).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт с реконструкцией
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт с реконструкцией
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт с реконструкцией
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт с реконструкцией
8.	**Все зоны и участки**	капитальный ремонт с реконструкцией

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *2015-2016г.* в рамках исполнения: *программы «Доступная среда».*
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-И (Г, У).**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДЧ-И (Г, У)**
4.4. Для принятия решения требуется :
4.4.1. согласование работ с надзорными органами: требуется *в сфере проектирования и строительства.*
4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: согласовано.
4.4.5. другое: -.
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
gymn6mail@yandex.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5.Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Путь движения к объекту	на 2 л.
Пути передвижения детей по территории МБОУ гимназии №6	на 1 л.
Схема движения специализированного автобуса	нет
Результаты фотофиксации на объекте: имеются	на 8 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ: имеется	на 16 л.
